



MAIN PASS



REPEAT PASS



REPEAT PASS



FREE PIPE PASS



FREE PIPE PASS



TEMP PASS



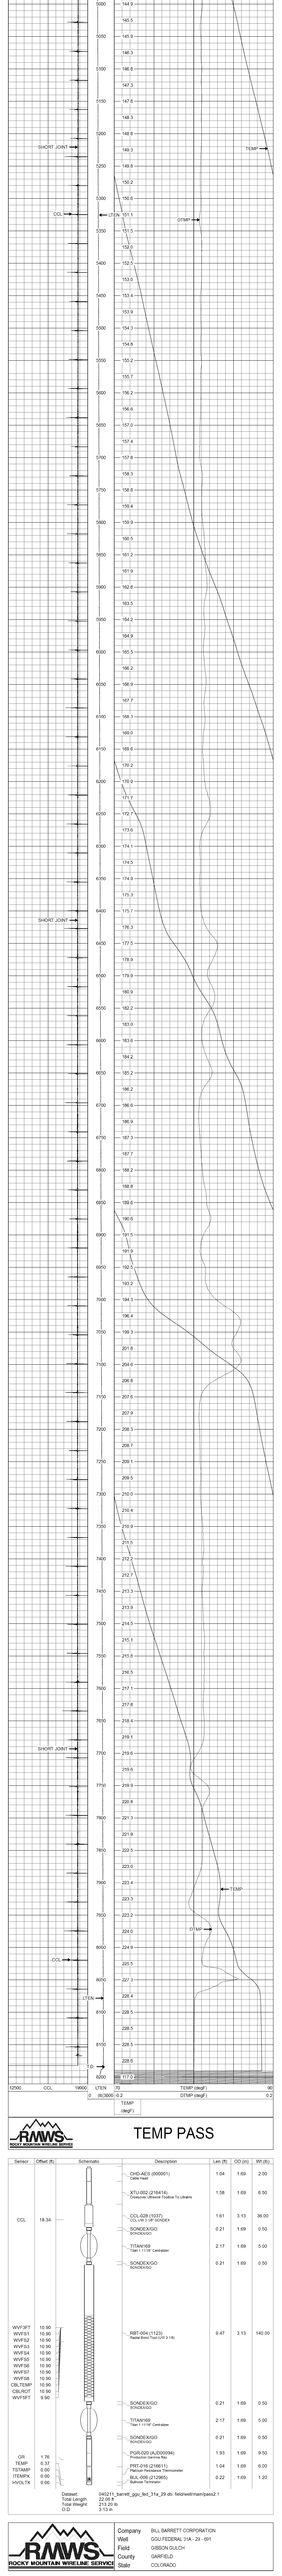

TEMP PASS

Sensor	Offset (ft)	Schematic	Description	Len (ft)	OD (in)	Wt (lb)
			CHD-AES (000001) Cable Head	1.04	1.69	2.00
			XTU-552 (216414) Crossover 28Rope6 Toolbus To Urtalink	1.58	1.69	6.50
CCL	18.34		CCL-026 (15372) CCL UAI 1 5/8 SHOCK	1.61	3.13	36.00
			SONDEXGO SONDEXGO	0.21	1.69	0.50
			TTAN169 Titan 1 11/16" Centralizer	2.17	1.69	5.00
			SONDEXGO SONDEXGO	0.21	1.69	0.50
WVF3FT	10.90					
WVF5T	10.90					
WVF52	10.90					
WVF53	10.90					
WVF54	10.90					
WVF55	10.90					
WVF56	10.90					
WVF5F	10.90					
WVF5R	10.90					
CBLTEMP	10.90					
CBLRGT	10.90					
WVF5FT	9.90		RBT-004 (1123) Radial Bond Tool (UH 3 1/8)	9.47	3.13	140.00
			SONDEXGO SONDEXGO	0.21	1.69	0.50
			TTAN169 Titan 1 11/16" Centralizer	2.17	1.69	5.00
			SONDEXGO SONDEXGO	0.21	1.69	0.50
GR	1.76		PGR-020 (AUD00034) Protection Gamma Ray	1.93	1.69	9.50
TEMP	0.37		PRT-016 (216811) Protection Temperature	1.04	1.69	6.00
TSTAMP	0.00					
ITEMPX	0.00		BUL-006 (212963) Bullnose Centralizer	0.22	1.69	1.20
HVOLTX	0.00					

Dataset: 040211_barrett_ggu_fed_31a_29 dl: field\well\main\pass2.1
Total Length: 213.26 ft
Total Weight: 313.8 lb
O.D.

Company	BILL BARRETT CORPORATION
Well	GGU FEDERAL 31A - 29 - 6S1
Field	GIBSON GULCH
County	GARFIELD
State	COLORADO
