Vertical, Original Hole, 11/26/2020 10:22:47 AM

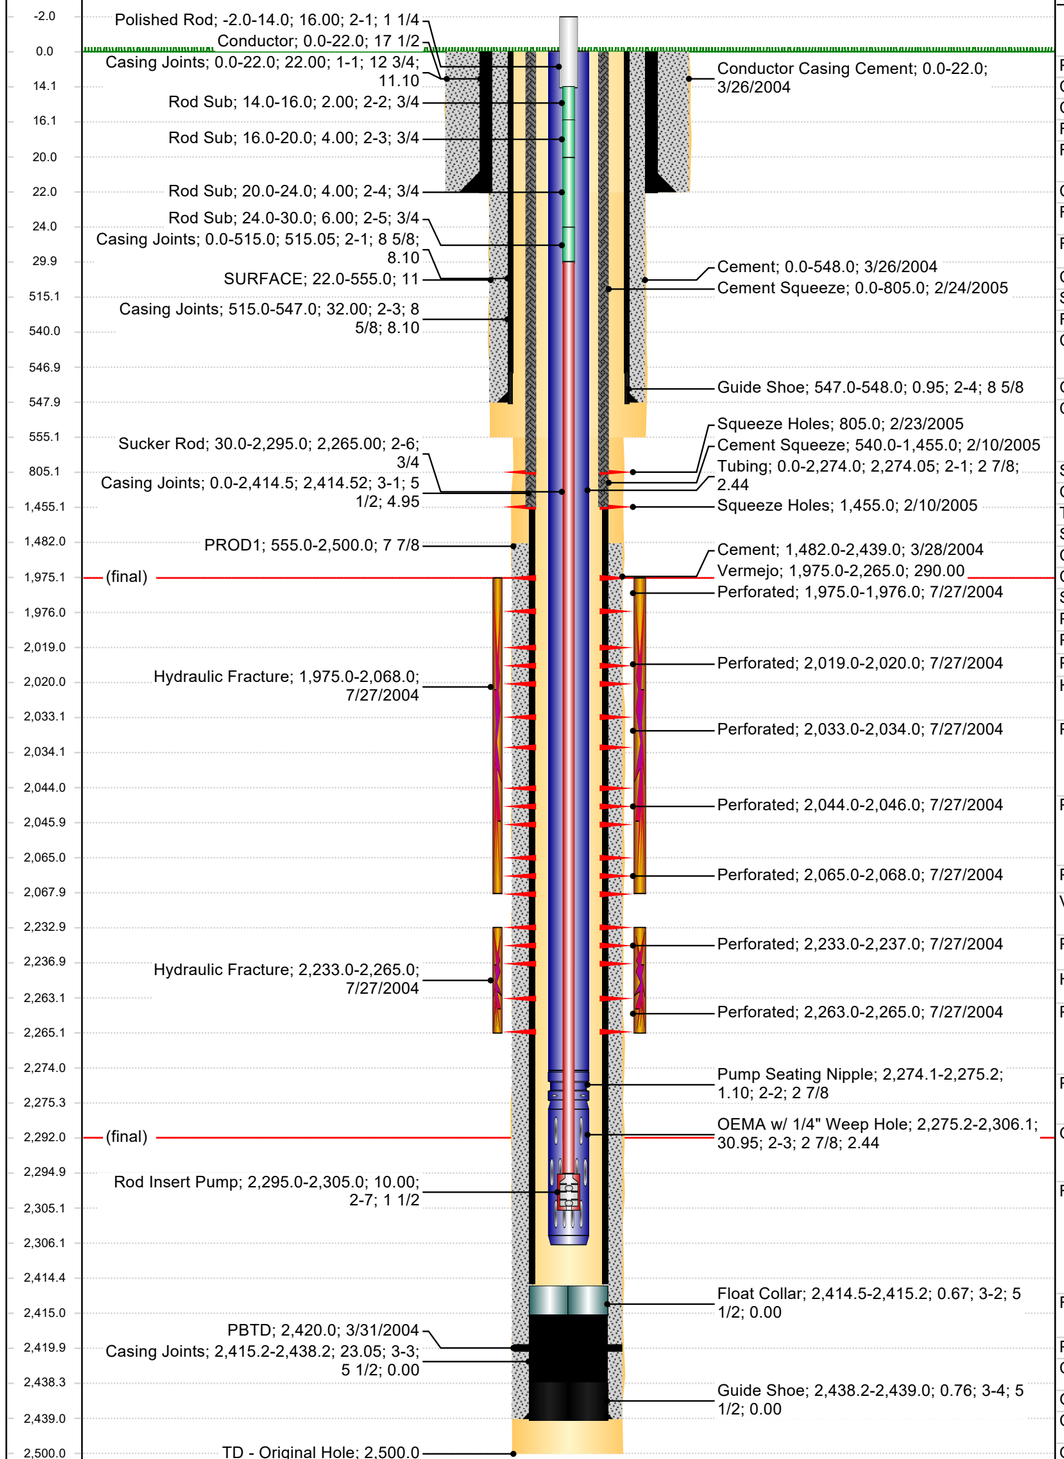


Column list (actual)

| Des | Depth MD | Length | OD | ID | Joint | Model | B.P. | C.P. | Str | Wt. | Category | Grad | Date | Make | Misc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polished Rod | -2.0-14.0 | 16.00 | 1 1/4 | | 1 | | | | Insert Pump | | Rod | | 3/19/201 | Norris | |
| Casing Joints | 0.0-22.0 | 22.00 | 12 | 11.1 | | | | | Conductor | | Casing | | 3/26/200 | | |
| Conductor | 0.0-22.0 | 22.00 | 17 | | | | | | | | Wellbore | | 3/26/200 | | Section Des: Conductor |
| Rod Sub | 14.0-16.0 | 2.00 | 3/4 | | 1 | | | | Insert Pump | | Rod | D | 3/19/201 | | |
| Rod Sub | 16.0-20.0 | 4.00 | 3/4 | | 1 | | | | Insert Pump | | Rod | D | 3/19/201 | | |
| Conductor Casing | 0.0-22.0 | 22.00 | | | | | | | | | Cement | | 3/26/200 | | Depth Plug Drilled Out To: |
| Rod Sub | 20.0-24.0 | 4.00 | 3/4 | | 1 | | | | Insert Pump | | Rod | D | 3/19/201 | | |
| Rod Sub | 24.0-30.0 | 6.00 | 3/4 | | 1 | | | | Insert Pump | | Rod | D | 3/19/201 | | |
| Casing Joints | 0.0-515.0 | 515.05 | 8 5/8 | 8.10 | 16 | | | 1,370. | Surface | 24.0 | Casing | J-55 | 3/26/200 | | |
| SURFACE | 22.0-555.0 | 533.00 | 11 | | | | | | | | Wellbore | | 3/26/200 | | Section Des: SURFACE |
| Float Valve | 515.0 | 0.00 | 8 5/8 | | 1 | | | | Surface | | Casing | | 3/26/200 | | |
| Casing Joints | 515.0-547.0 | 32.00 | 8 5/8 | 8.10 | 1 | | | 1,370. | Surface | 24.0 | Casing | J-55 | 3/26/200 | | |
| Guide Shoe | 547.0-548.0 | 0.95 | 8 5/8 | | 1 | | | | Surface | | Casing | | 3/26/200 | | |
| Cement | 0.0-548.0 | 548.00 | | | | | | | | | Cement | | 3/26/200 | | Depth Plug Drilled Out To: |
| Squeeze Holes | 805.0 | 0.00 | | | | | | | | | Perf | | 2/23/200 | | Shot Dens: 3.0shots/ft |
| Cement Squeeze | 0.0-805.0 | 805.00 | | | | | | | | | Cement | | 2/24/200 | | Depth Plug Drilled Out To: |
| Tubing | 0.0-2,274.0 | 2,274.0 | 2 7/8 | 2.44 | 72 | T&C | 7,260. | 7,680. | Tubing - | 6.50 | Tubing | J-55 | 3/19/201 | | Status: |
| Sucker Rod | 30.0-2,295.0 | 2,265.0 | 3/4 | | 90 | WCN-78 | | | Insert Pump | | Rod | D | 3/19/201 | Norris | |
| Casing Joints | 0.0-2,414.5 | 2,414.5 | 5 1/2 | 4.95 | 63 | | | 4,040. | Production | 15.5 | Casing | J-55 | 3/28/200 | | |
| Cement Squeeze | 540.0-1,455.0 | 915.00 | | | | | | | | | Cement | | 2/10/200 | | Depth Plug Drilled Out To: |
| Squeeze Holes | 1,455.0 | 0.00 | | | | | | | | | Perf | | 2/10/200 | | Shot Dens: 3.0shots/ft |
| PROD1 | 555.0-2,500.0 | 1,945.0 | 7 7/8 | | | | | | | | Wellbore | | 3/27/200 | | Section Des: PROD1 |
| Perforated | 1,975.0-1,976. | 1.00 | | | | | | | | | Perf | | 7/27/200 | | Shot Dens: 4.0shots/ft |
| Perforated | 2,019.0-2,020. | 1.00 | | | | | | | | | Perf | | 7/27/200 | | Shot Dens: 4.0shots/ft |
| Hydraulic Fracture | 1,975.0-2,068. | 93.00 | | | | | | | | | Stims and | | 7/27/200 | | |
| Perforated | 2,033.0-2,034. | 1.00 | | | | | | | | | Perf | | 7/27/200 | | Shot Dens: 4.0shots/ft |
| Perforated | 2,044.0-2,046. | 2.00 | | | | | | | | | Perf | | 7/27/200 | | Shot Dens: 4.0shots/ft |
| Perforated | 2,065.0-2,068. | 3.00 | | | | | | | | | Perf | | 7/27/200 | | Shot Dens: 4.0shots/ft |
| Vermejo | 1,975.0-2,265. | 290.00 | | | | | | | | | Zone | | | | 94782, 511641; |
| Perforated | 2,233.0-2,237. | 4.00 | | | | | | | | | Perf | | 7/27/200 | | Shot Dens: 4.0shots/ft |
| Hydraulic Fracture | 2,233.0-2,265. | 32.00 | | | | | | | | | Stims and | | 7/27/200 | | |
| Perforated | 2,263.0-2,265. | 2.00 | | | | | | | | | Perf | | 7/27/200 | | Shot Dens: 4.0shots/ft |
| Pump Seating Nipple | 2,274.1-2,275. | 1.10 | 2 7/8 | | 1 | | | | Tubing - | | Tubing | | 3/19/201 | | Status: |
| OEMA w/ 1/4" Weep Hole | 2,275.2-2,306. | 30.95 | 2 7/8 | 2.44 | 1 | | | | Tubing - | 6.50 | Tubing | J-55 | 3/19/201 | | Status: |
| Rod Insert Pump | 2,295.0-2,305. | 10.00 | 1 1/2 | | 1 | RWAC | | | Insert Pump | | Rod | | 3/19/201 | H | |
| Float Collar | 2,414.5-2,415. | 0.67 | 5 1/2 | 0.00 | 1 | | | | Production | | Casing | | 3/28/200 | | |
| PBTD | 2,420.0 | 0.00 | | | | | | | | | PBTD | | 3/31/200 | | |
| Casing Joints | 2,415.2-2,438. | 23.05 | 5 1/2 | 0.00 | 1 | | | 4,040. | Production | 15.5 | Casing | J-55 | 3/28/200 | | |
| Guide Shoe | 2,438.2-2,439. | 0.76 | 5 1/2 | 0.00 | 1 | | | | Production | | Casing | | 3/28/200 | | |
| Cement | 1,482.0-2,439. | 957.00 | | | | | | | | | Cement | | 3/28/200 | | Depth Plug Drilled Out To: |
| Original Hole | 0.0-2,500.0 | | | | | | | | | | Wellbore | | | | |
