Vertical, Original Hole, 11/26/2020 10:21:42 AM

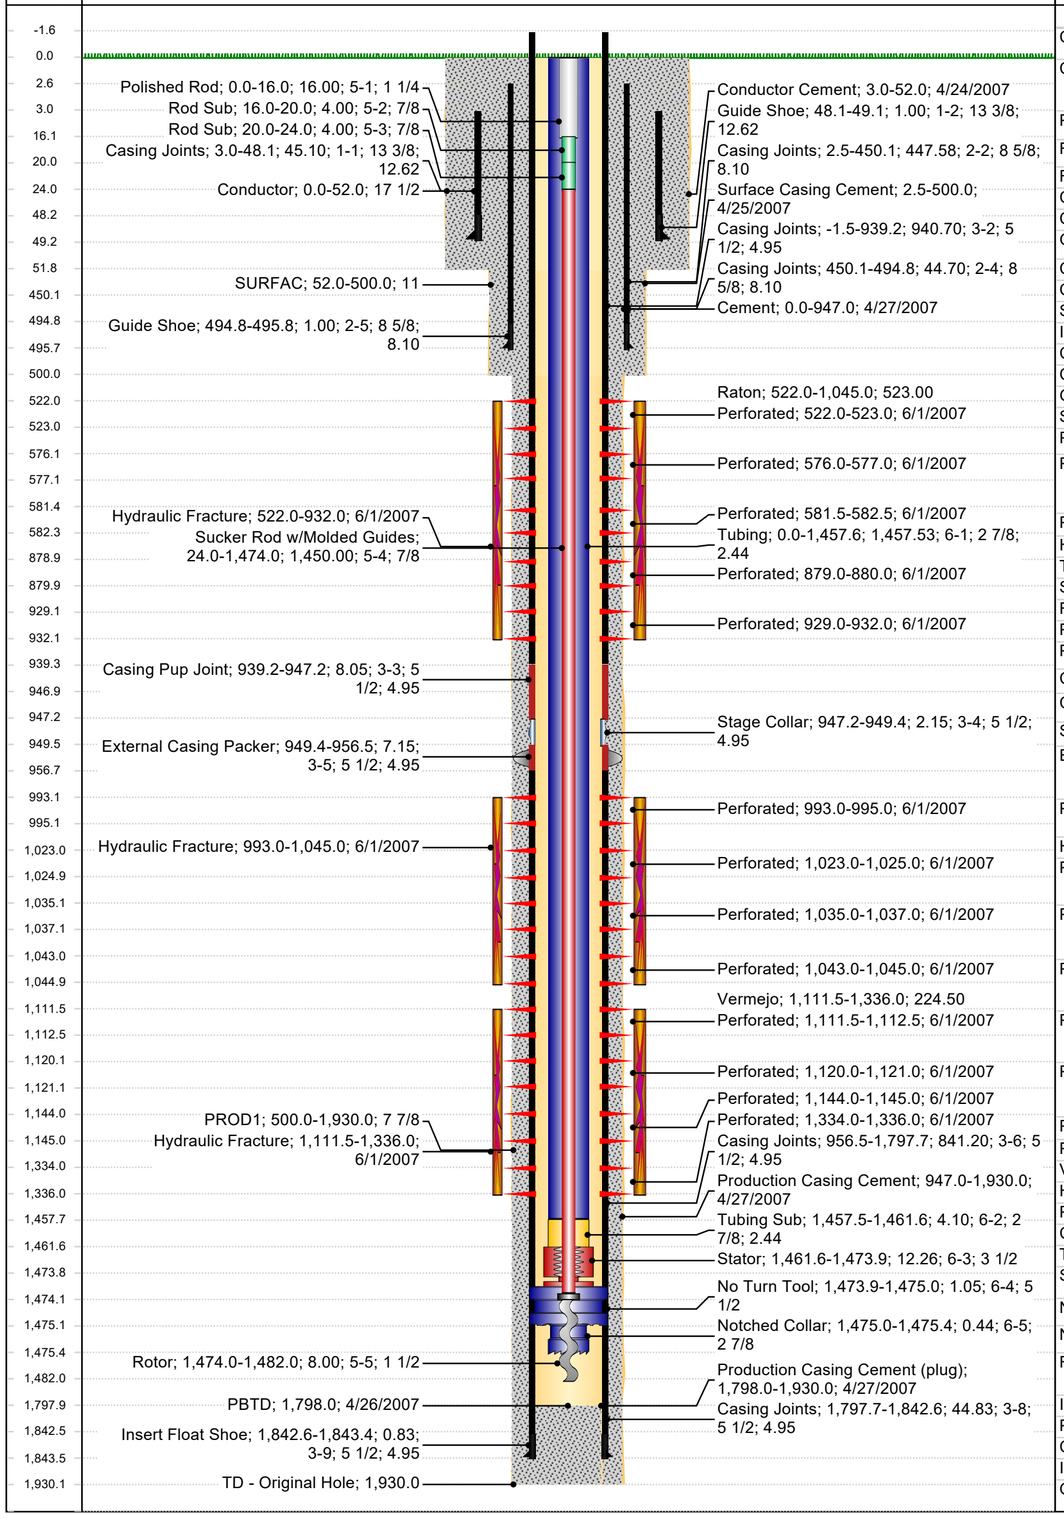

Column list (actual)

Des	Depth MD	Length	OD	ID	Joint	Model	B.P.	C.P.	Str	Wt.	Category	Grad	Date	Make	Misc
Collar AGL	0.0--1.5	-1.50			1				Production		Casing		4/26/200		
Collar BGL	0.0-2.5	2.50			1				Surface		Casing		4/25/200		
Polished Rod	0.0-16.0	16.00	1 1/4		1				Rod - Rotor		Rod		2/7/2013	Norris	
Rod Sub	16.0-20.0	4.00	7/8		1				Rod - Rotor		Rod	D	2/7/2013		
Rod Sub	20.0-24.0	4.00	7/8		1				Rod - Rotor		Rod	D	2/7/2013		
Casing Joints	3.0-48.1	45.10	13	12.6	1			1,130.	Conductor	54.5	Casing	J-55	4/24/200		
Conductor	0.0-52.0	52.00	17								Wellbore		4/24/200		Section Des: Conductor
Guide Shoe	48.1-49.1	1.00	13	12.6	1				Conductor	54.5	Casing	J-55	4/24/200		
Conductor Cement	3.0-52.0	49.00									Cement		4/24/200		Depth Plug Drilled Out
Casing Joints	2.5-450.1	447.58	8 5/8	8.10	10			1,370.	Surface	24.0	Casing	J-55	4/25/200		
SURFAC	52.0-500.0	448.00	11								Wellbore		4/25/200		Section Des: SURFAC
Insert Float Valve	450.1	0.00	8 5/8	8.10	1				Surface	24.0	Casing	J-55	4/25/200		
Casing Joints	-1.5-939.2	940.70	5 1/2	4.95	21			4,040.	Production	15.5	Casing	J-55	4/26/200		
Casing Joints	450.1-494.8	44.70	8 5/8	8.10	1			1,370.	Surface	24.0	Casing	J-55	4/25/200		
Guide Shoe	494.8-495.8	1.00	8 5/8	8.10	1				Surface	24.0	Casing	J-55	4/25/200		
Surface Casing Cement	2.5-500.0	497.50									Cement		4/25/200		Depth Plug Drilled Out
Perforated	522.0-523.0	1.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
Perforated	576.0-577.0	1.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
Perforated	581.5-582.5	1.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
Hydraulic Fracture	522.0-932.0	410.00									Stims and		6/1/2007		
Tubing	0.0-1,457.6	1,457.5	2 7/8	2.44	47	T&C	7,260.	7,680.	Tubing -	6.50	Tubing	J-55	2/7/2013		Status:
Sucker Rod w/Molded	24.0-1,474.0	1,450.0	7/8		58				Rod - Rotor		Rod	D	2/7/2013	Norris	
Raton	522.0-1,045.0	523.00									Zone				94976, 543773;
Perforated	879.0-880.0	1.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
Perforated	929.0-932.0	3.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
Casing Pup Joint	939.2-947.2	8.05	5 1/2	4.95	1				Production	15.5	Casing	J-55	4/26/200		
Cement	0.0-947.0	947.00									Cement		4/27/200		Depth Plug Drilled Out
Stage Collar	947.2-949.4	2.15	5 1/2	4.95	1				Production	15.5	Casing	J-55	4/26/200		
External Casing Packer	949.4-956.5	7.15	5 1/2	4.95	1				Production	15.5	Casing	J-55	4/26/200		
Perforated	993.0-995.0	2.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
Hydraulic Fracture	993.0-1,045.0	52.00									Stims and		6/1/2007		
Perforated	1,023.0-1,025.	2.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
Perforated	1,035.0-1,037.	2.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
Perforated	1,043.0-1,045.	2.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
Perforated	1,111.5-1,112.	1.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
Perforated	1,120.0-1,121.	1.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
Perforated	1,144.0-1,145.	1.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
PROD1	500.0-1,930.0	1,430.0	7 7/8								Wellbore		4/26/200		Section Des: PROD1
Vermejo	1,111.5-1,336.	224.50									Zone				94976, 543773;
Hydraulic Fracture	1,111.5-1,336.	224.50									Stims and		6/1/2007		
Perforated	1,334.0-1,336.	2.00									Perf		6/1/2007		Shot Dens:
Casing Joints	956.5-1,797.7	841.20	5 1/2	4.95	19			4,040.	Production	15.5	Casing	J-55	4/26/200		
Tubing Sub	1,457.5-1,461.	4.10	2 7/8	2.44	1	T&C			Tubing -	6.50	Tubing	J-55	2/7/2013		Status:
Stator	1,461.6-1,473.	12.26	3 1/2		1	30N095			Tubing -		Tubing		2/7/2013	Wilson	Status:
No Turn Tool	1,473.9-1,475.	1.05	5 1/2		1				Tubing -		Tubing		2/7/2013		Status:
Notched Collar	1,475.0-1,475.	0.44	2 7/8		1				Tubing -		Tubing		2/7/2013		Status:
Rotor	1,474.0-1,482.	8.00	1 1/2			30N095			Rod - Rotor		Rod		2/7/2013	R&M	
Insert Float Valve	1,797.7	0.00	5 1/2	4.95	1				Production	15.5	Casing	J-55	4/26/200		
PBTD	1,798.0	0.00									PBTD		4/26/200		
Casing Joints	1,797.7-1,842.	44.83	5 1/2	4.95	1			4,040.	Production	15.5	Casing	J-55	4/26/200		
Insert Float Shoe	1,842.6-1,843.	0.83	5 1/2	4.95	1				Production	15.5	Casing	J-55	4/26/200		
Original Hole	0.0-1,930.0										Wellbore				
