TEP Rocky Mountain LLC
RU 31-7
Rulison Field
Section 7 T 7S-R93W

Formation Tops
(Measured Depths)

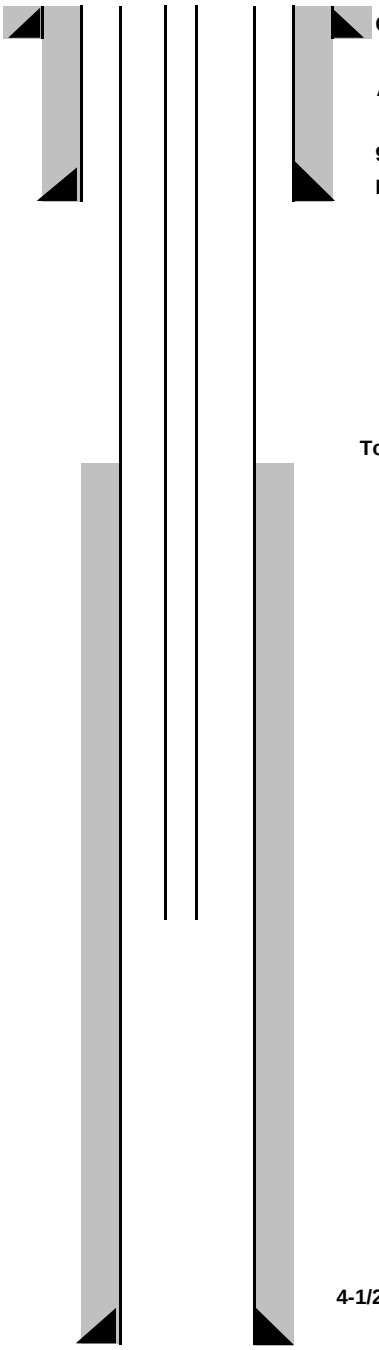

Conductor 26" Hole 18" casing/liner 63' W/ 15.75 Sks

AFL **494'**

9-5/8" 32.3 ppf Csg. Set @1174'
In 13-1/2" Hole W/305Sks.

Top Of Cement **3900**

"G" Sand @	**3218**
Mesaverde @	**5694**
Cameo @	**8456**

Tubing not set

PBTD @	**9871**
Float Collar @	**9898**
TMD @	**9937**
TVD @	**9484**
Est.Top Perf @	**7134**
Top Of Gas @	**7234**

4-1/2", 11.6 ppf. Csg. Set @9,927' W/1120SKS
