NR 441-3 Wellbore Diagram

Well	Pad	API
NR 441-3	NR 23-3 RV	05-045-24479

Diagram Date	Spud Date	First Production Date
10/5/2022	5/17/2022	9/8/2022

Location	Meridian	County
NWSW	6th	Garfield

Top Perf	Bottom Perf	Current EOT
7,782	11,123	10,780

Bottom Surf Csg	Bottom Prod Csg	TOC
1,119	11,198	4,752

TD	TVD	Elevation
11,208	9,991	6,728

PBTD	PBTVD	KB
11,162	9,944	6,758
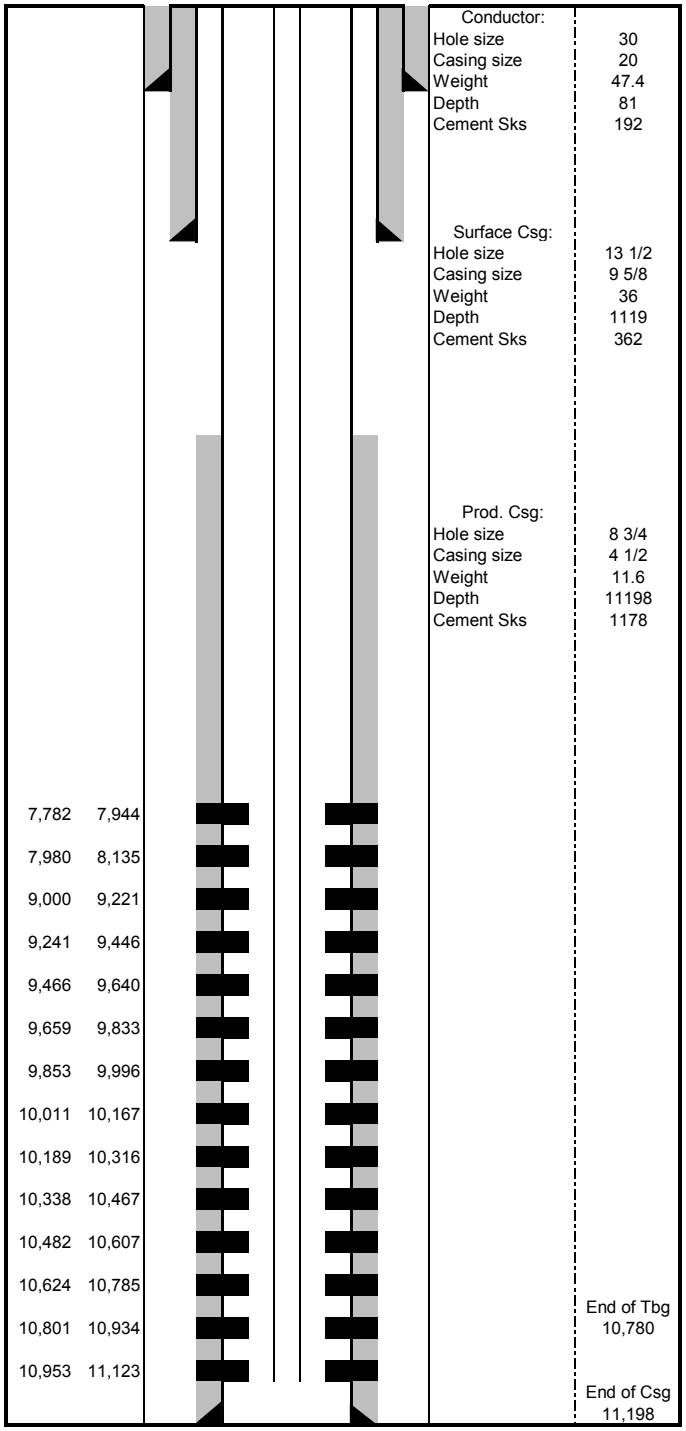
Formation Tops	
Wasatch	0
Wasatch G	4,186
Ohio Creek	7,373
Williams Fork	8,177
Cameo	10,311
Rollins	11,176
