Confluence DJ LLC
Bigfoot 11-10-3
Future Producing Fm: Nio C
05-123-51763
NWSW 11-4N-63W
Weld County, CO

		MD	TVD
SB Crossing			
TOE	1299' FSL, 460' FEL	11,492	6,431
HEEL	1271' FSL, 460' FWL	7,070	6,435

Tubing String	Length	Running	Approx Inc

Form Tops	MD	TVD
Pierre	1,604	1,575
Parkman	3,427	3,344
Sussex	4,078	3,975
Shannon	4,812	4,687
Sharon S	6,296	6,110
Niobrara A	6,456	6,248
Niobrara B	6,451	6,309
Niobrara C	6,671	6,383

			Dates
Conductor:	16" 43# of A52A @ 80'	GL/KB - 4,563' / 4,579.5' KB - 16.5'	8/4/2022
Surface:			9/4/2022
Hole Size:	13-1/2", 1,785' TD		9/5/2022
Casing:	9-5/8" 36# J-55 LTC @ 1,779'		9/5/2022
Cement:	40 bbl Mud Flush		
	705 sx Cement, 13.9#, 1.61 Yield		
	Displacement: 135 bbls		
	39 bbls to Surface		
TOC @ 1436' CBL			
Production:			11/15/2022
Hole Size:	8-1/2", 11,540' TD		11/19/2022
Casing:	5-1/2" 20# P110 GBCD @ 11,520' MD		11/19/2022
Cement:	Spacer: 30 bbls Diesel		11/20/2022
	Spacer: 145 bbls 12.5 ppg Tuned Spacer		
	Slurry: 378 bbls (1440 sks) 14.5# Cement, Yield 1.47		
	Displacement: 253 bbls water		
	Plug bumped to 3400 psi, 40 bbls spacer back		

Directional Data

	MD	TVD	
KOP	5,847	5,691	13°
30°	6,318	6,135	
60°	6,648	6,372	
460' Set Back:	7,070	6,435	89°
Landing 90°	7,225	6,437	
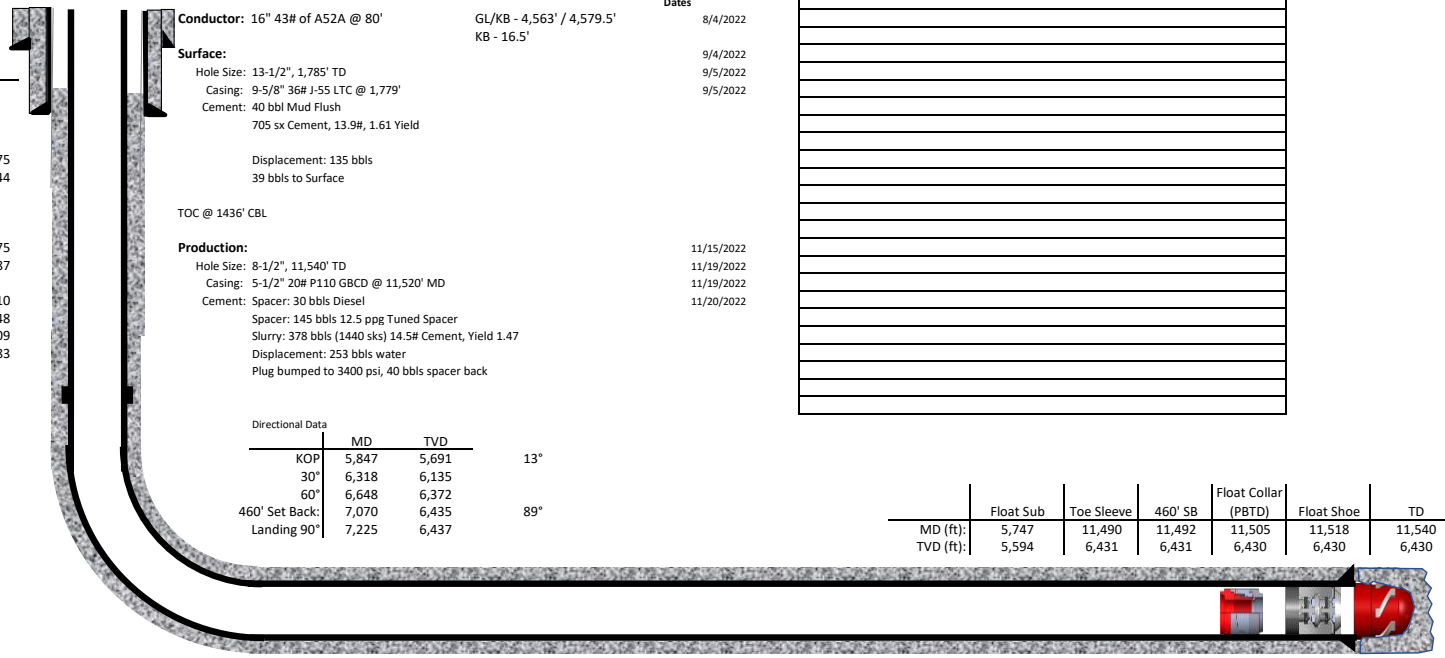
	Float Sub	Toe Sleeve	460' SB	Float Collar (PBTD)	Float Shoe	TD
MD (ft):	5,747	11,490	11,492	11,505	11,518	11,540
TVD (ft):	5,594	6,431	6,431	6,430	6,430	6,430
