Confluence DJ LLC
Bigfoot 11-5-4
Future Producing Fm: Codell
05-123-51764
NWSW 11-4N-63W
Weld County, CO

		MD	TVD
SB Crossing			
TOE	823' FSL, 460' FEL	11,578	6,510
HEEL	814' FSL, 460' FWL	7,166	6,512

Tubing String	Length	Running	Approx Inc

Form Tops	MD	TVD
Pierre	1,632	1,593
Parkman	3,477	3,356
Sussex	4,153	4,000
Shannon	4,854	4,669
Sharon S	6,365	6,106
Niobrara A	6,534	6,245
Niobrara B	6,615	6,304
Niobrara C	6,731	6,376
Codell	7,169	6,511

Conductor: 16" 43# of A52A @ 80'
GL/KB - 4,563' / 4,579.5'
KB - 16.5'

Surface: 9/3/2022
Hole Size: 13-1/2", 1,789' TD 9/3/2022
Casing: 9-5/8" 36# J-55 LTC @ 1,779' 9/4/2022
Cement: 40 bbl Mud Flush
705 sx Cement, 13.9#, 1.61 Yield
Displacement: 135 bbls
36 bbls to Surface

TOC @ 4024' CBL

Production: 11/27/2022
Hole Size: 8-1/2", 11,608' TD 12/2/2022
Casing: 5-1/2" 20# P110 GBCD @ 11,585' MD 12/2/2022
Cement: Spacer: 30 bbls Diesel 12/3/2022
Spacer: 145 bbls 12.5 ppg Tuned Spacer
Slurry: 384 bbls (1465 sks) 14.5# Cement, Yield 1.47
Displacement: 257 bbls water
Plug bumped to 3500 psi, 35 bbls spacer back

Dates

Directional Data

	MD	TVD	
KOP	5,744	5,519	17°
30°	6,402	6,142	
60°	6,795	6,413	
460' Set Back:	7,166	6,512	87°
Landing 90°	7,218	6,514	
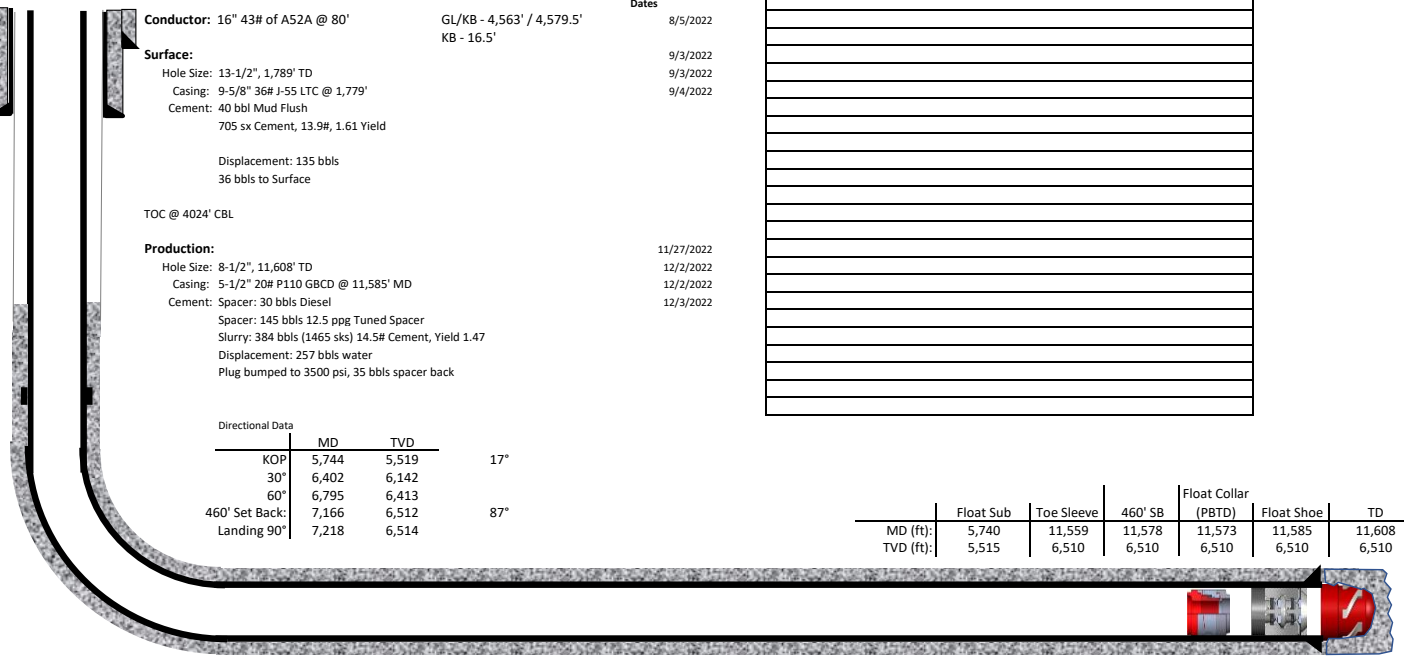
	Float Sub	Toe Sleeve	460' SB	Float Collar (PBTD)	Float Shoe	TD
MD (ft):	5,740	11,559	11,578	11,573	11,585	11,608
TVD (ft):	5,515	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510
